

# Møde med vandværkerne på Helgenæs

25. august 2016



---

## **Deltagere:**

### **Helgenæsvand:**

Sven Weel, Christen Jacobsen

### **Fejrup Strand Vandværk:**

Jon Hune

### **Asgilhøje Vandværk:**

Kjeld Mortensen, Arne Vingren, Leif Spange Mortensen, Poul Sørensen

### **Kongsgårde-Borup Vandværk:**

### **Helgenæs Pumpestation: [Stødov Bakker Vandværk, Stødov-Fejrup Vandværk, Gl. Kirkebjerg Andelsvandværk]**


Finn Mathiasen, Mogens Vognsen, Niels Nørregaard

Syddjurs Kommune: Steen Wengel, Anna O. Brahe

## **Dagsorden**

1. Velkomst
2. Status
3. Plan
4. Evt.

## 2. Status

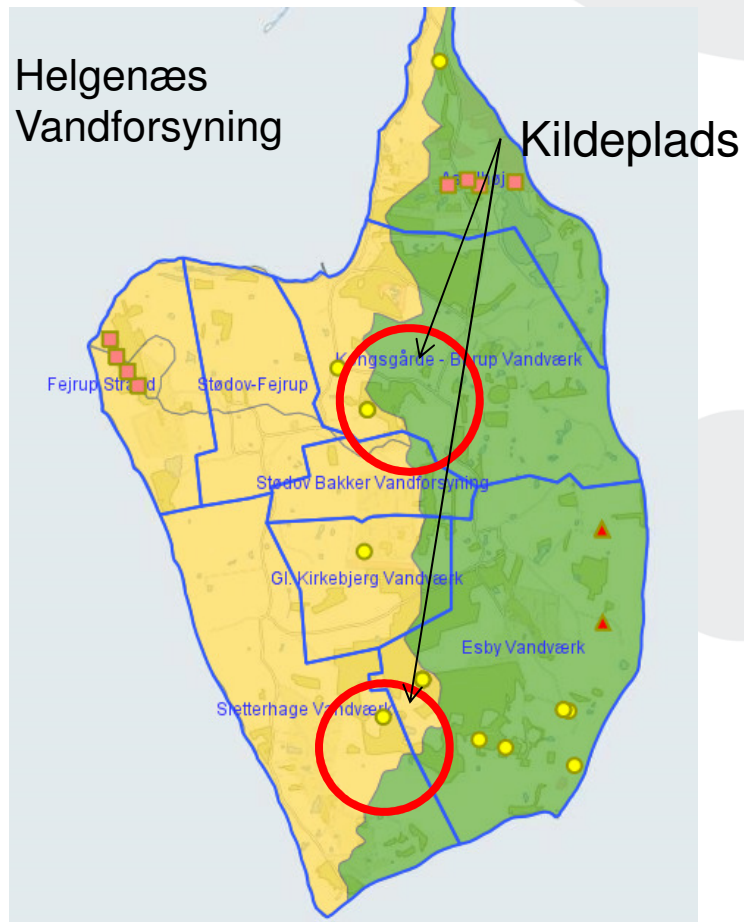

### Model

1 (2) vandværk  
(vandbehandling)


2 kildeplads

2 – 5 boringer

1 Virksomhed

Projektperiode: 10 år

## Model for sammenlægning

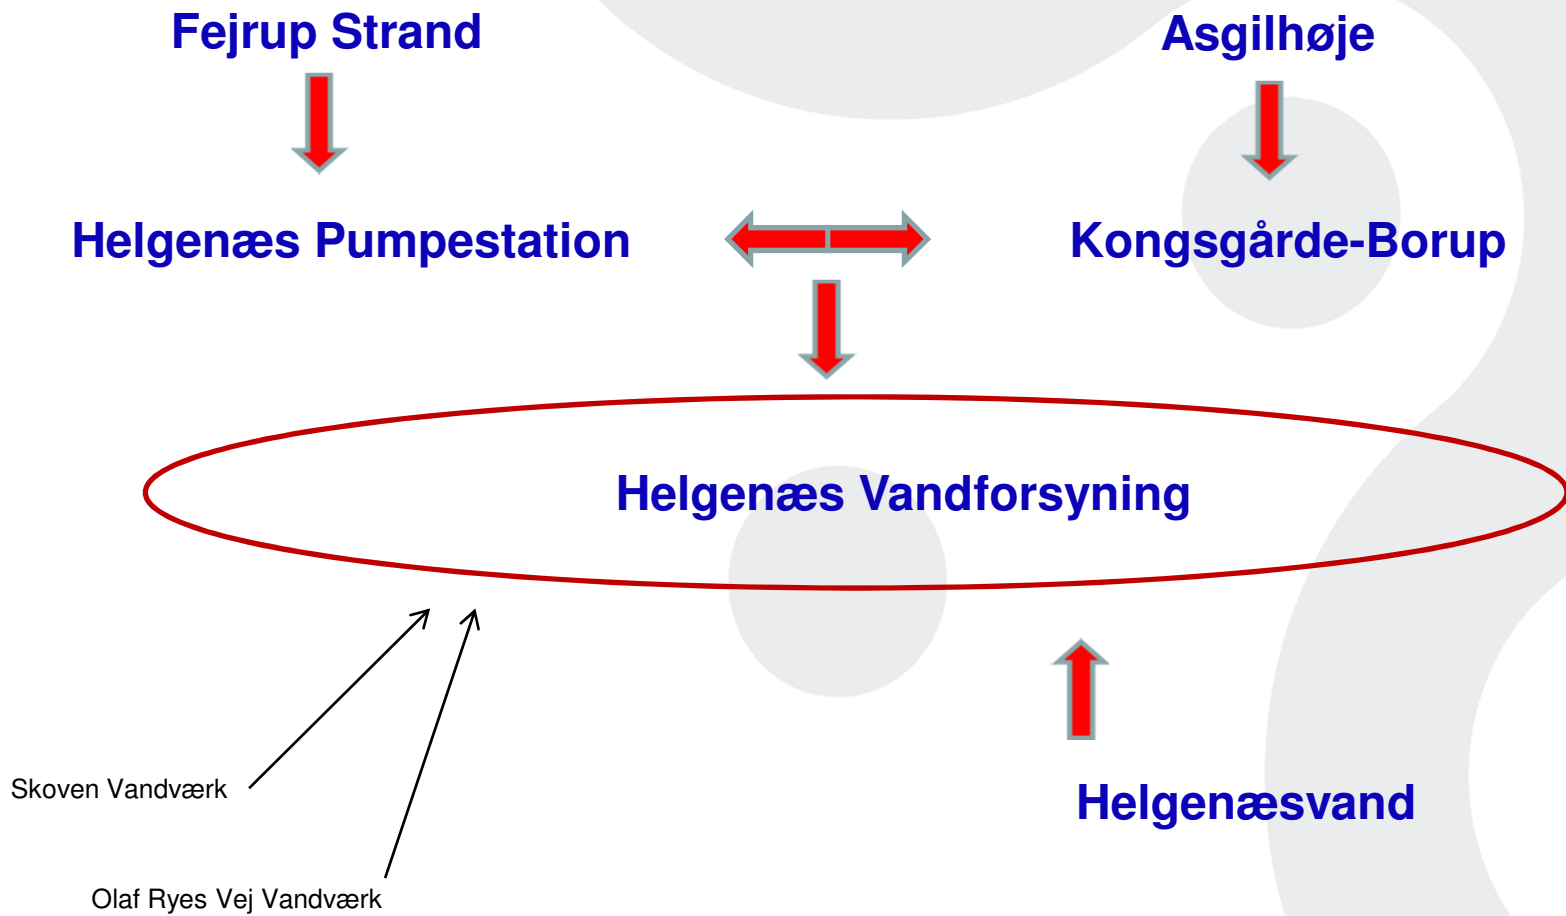

## Opgaver (Vandværker)

### Administrative opgaver

1. Sammenlægningen af vandværker skal godkendes på de enkelte vandværkers generalforsamlinger.
2. Opsparing til større investeringer
3. Indsamling af anlægsdata m.v.


### Tekniske opgaver

1. Flaskehalse på ledningsnettet (Kongsgårde-Borup Vandværk)
2. Råvandsledninger
3. Hovedforsyningsledninger
4. Ny kildeplads (boring) på nordlige del af Helgenæs i Kongsgård-Borup forsyningsområde

## Grundvandsgruppens opgaver

1. Godkende sammenlægning (vandforsyningsplan)
2. Udarbejde tilladelser (boring, indvindingstilladelser) (§20VFL)
3. Godkendelse af tekniske ændringer (§21 VFL)
4. Bidrage med anlægsdata
5. Andet

## 2. Plan

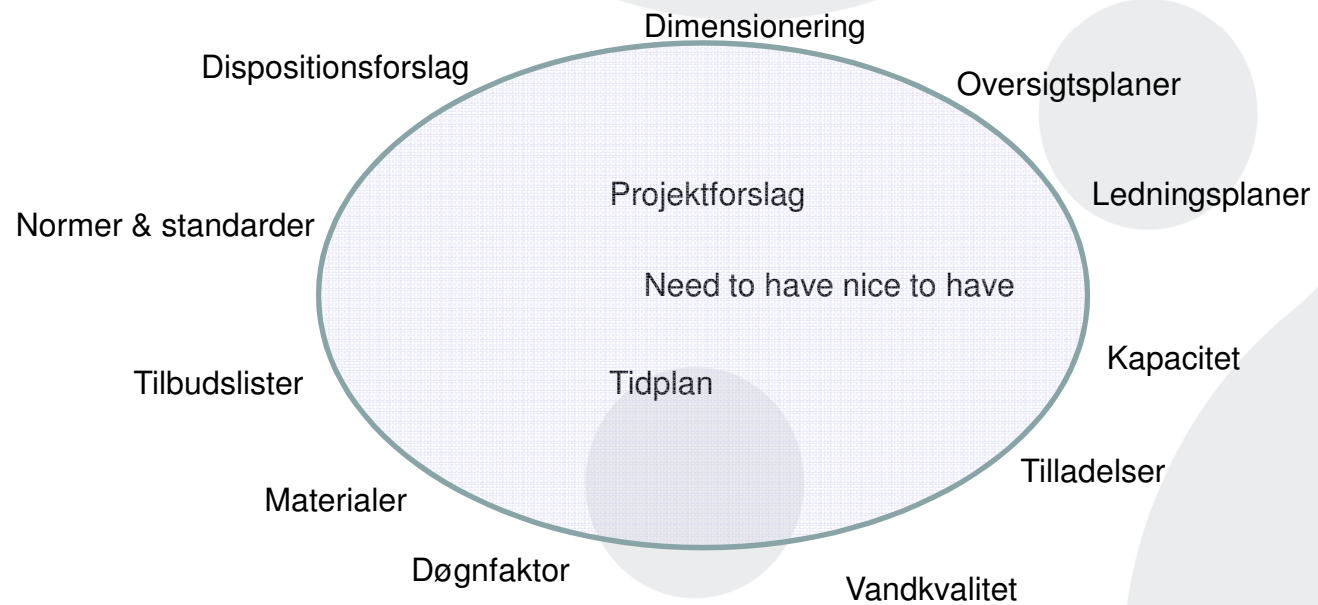



## Tidslinje og aktiviteter for sammenlægning af vandværker



Kilde: Danske Vandværker

## Tidslinje med aktiviteter for Helgenæs



## 2. Plan (fortsat)

**Niels Nørregaard**



- Budgetliste
- Forslag til teknisk sammenkobling

### **3. Plan (fortsat)**

#### **Drøftelse i plenum**

#### **4. Evt.**

- Næste møde (dato)
